





Welcome



SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LTD

Area Selected for Area Based Development

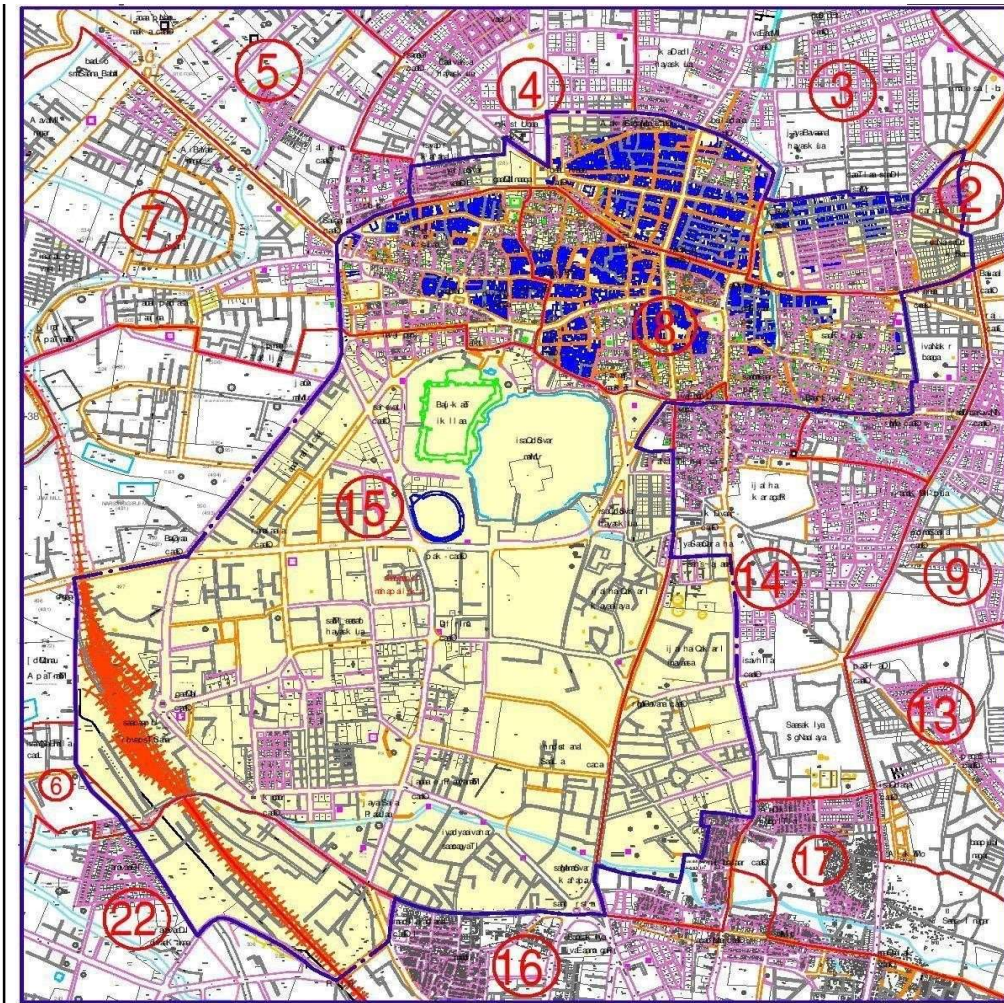

Details of identified area

- Navi Peth, Budhvar Peth, Ganesh Peth, Shukravar Peth, Siddheshwar Mandir, Bhuikot Fort, Siddheshwar Peth, Old Employment Chowk, South Sadar Bazar

Total Area = 1040 Acres

Population – 1,49,908

Election Ward (Old) : 5 Complete Ward (13, 14, 15, 25, 27) and 9 Partially ward 9 (4, 7, 8, 12, 16, 24, 26, 31, 33)

Election Ward (New) : 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 22, All wards are partially covered

Project & A &OE Funds SPV

Sr. no.	Nature Of Fund	Source of Fund	Amount Rs. in Crores
1	Project Fund & A&OE	Central Government	392.00
2	Project Fund & A&OE	State Government	196.00
3	Project Fund	ULB- Solapur Municipal Corp.	165.48
		Total	753.48
		31st October 2022 Project Expenses and A&OE	696.94
		Funds balance	56.54

Completed Projects

Work Completed Project

Sr. No.	Project Name	DPR Cost	Work Order Amount (Without GST)	Total Outlay till Project Completion (With GST+ Taxes Supervision Charges & Other Incidental expenses)	Excess/ Savings in DPR as compared to Project outlay.	Expenses
1	Open gym	0.10	0.03	0.03	0.07	0.03
2	E-Toilet : Ph-I	1.10	1.10	1.10	-	0.84
3	Smart Kiosk	0.10	0.08	0.08	0.02	0.08
4	SWM_Ghanta Gadi 2.2 Cum (60)	3.07	3.77	3.77	-	3.77
5	SWM_Ghanta Gadi 3.2 Cum (30)	2.00	1.59	1.67	0.33	1.67
6	SWM_Ghanta Gadi 3.2 Cum (30)	2.00	1.59	1.67	0.33	1.67
7	Improvement in water supply	0.25	0.24	0.27	-	0.23
8	Khind Road	1.36	1.17	1.31	0.05	1.20
9	Flow meter	0.32	0.32	0.36	-	0.16
10	Dustbin Phase 1	0.98	0.98	0.98	-	0.98
11	Smart Road Phase 1	5.13	4.38	4.38	0.75	4.53
12	Hoam Ground	2.60	2.42	2.98	-	3.13
13	Transfer Station Equipment	3.23	3.22	3.26	-	3.26

Work Completed Project

14	Transfer Station Civil	3.00	2.57	2.89	0.11	2.89
15	Hutatma Garden Phase-2	2.12	1.43	2.00	0.12	1.88
16	Smart Classroom Civil and Electrical work	0.12	0.10	0.11	0.01	0.11
17	IEC for SWM	0.58	0.58	0.65	0.07	0.58
18	Department Garden	5.31	4.31	4.83	0.48	4.63
19	Smart Road Phase 2	23.83	20.32	21.50	2.33	22.29
20	Street Bazaar	3.53	2.81	3.15	0.38	3.16
21	40 Electronic Toilets at 20 locations: Ph-II	3.95	3.58	4.01	0.06	2.46
22	Indira Gandhi Stadium PH -I	9.41	7.10	10.50	1.09	11.15
23	Improvements in WS and SW system	226.00	209.00	235.00	9.00	214.20
24	Content management for Rangbhavan Chowk	0.40	0.28	0.28	0.12	0.28
25	LED Street light Infrastructure	17.40	12.43	17.50	0.10	13.90

Work Completed Project



Smart City

26	Siddheshwar Lake front development	16.86	13.24	14.83	2.03	13.57
27	Roof top solar - (Part 1) - 900 KW	3.20	3.20	3.58	0.38	1.25
28	Roof top solar - (Part 2) - 196 KW	0.56	0.70	0.78	0.22	0.57
29	Dustbins Household Phase-02	0.96	0.96	0.96	-	0.66
30	IEC for SWM-Year-2	0.58	0.58	0.58	-	0.58
31	10.8 Km Priority Road	121.30	99.84	125.00	3.70	124.75
32	Laxmi Market - Rejuvenation of Heritage Structure	10.70	8.23	9.87	0.83	9.54
33	Sidheshwar Lake improvement	3.55	2.68	3.00	0.05	3.05
34	Light and sound show in Sidheshwar Lake	8.67	7.75	8.67	1.52	8.34
35	Development of place for exhibition	10.00	3.65	4.10	5.90	3.53
36	To Setup and Manage an Incubation Centre in Solapur	4.00	3.24	3.91	0.09	0.65
37	Roof top solar - government Buildings- Phase 2	4.03	4.57	5.12	-1.09	2.29
38	Water Audit & Hydraulic Modelling and Master Plan Solapur	3.23	1.86	2.09	2.09	1.31
39	Indira Gandhi Stadium Phase 2	9.69	8.60	10.14	10.14	6.95

Work Completed Project

40	Street Light pole (RSJ) infrastructure PH-2	5.11	5.11	5.11	5.11	4.18
41	Utility Ducts DWC DUCT- Crescent	20.59	18.01	21.25	-0.66	13.54
42	Redesigning of the road sections to cover (Resurfacing Road)	14.65	13.41	15.82	-1.17	9.12
	a. Sub Total (42 Projects) SCDCL	555.57	481.03	548.95		502.96
43	Convergence Projects : Through SMC LED Street Lights EESL & Garden Development	53.89	53.89	53.89	-	
	b. Subtotal Convergence	53.89	53.89	53.89	-	
	Total	609.46	534.92	602.84		502.96

Clean city –Solid Waste Management

B. Procurement of waste Collection vehicle : Procurement of 60 vehicles of 2.2 cum and 60 vehicles of 3.2 cum completed and vehicles are handed over to SMC

घंटागाडी खरेदी करणे - सोलापूर महानगरपालिकेकडे पुर्वी १०५

घंटागाड्या उपलब्ध होत्या. घनकचरा व्यवस्थापन करणेकरीता घंटागाड्याची संख्या वाढवणे आवश्यक होते. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेच्या निधीतून टाटा कंपनीकडून २.२ घ.मी. क्षमतेच्या ६० गाड्या व ३.२ घ.मी क्षमतेच्या ६० गाड्या खरेदी करणेत येउन त्यांचा वापर शहरामध्ये चालू झाला आहे. यामुळे घंटागाड्याची संख्या वाढली असून प्रत्येक नागरिकांच्या घरोघरी घंटागाडी जात असून रस्त्यावर अथवा कचराकुडी मध्ये कचरा टाकण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये घंटागाडी दररोज जाणेकरीता त्याचा रुटमॅप करणेत आलेला आहे. सदर घंटागाडी मध्ये ओला व सुका कचरा साठविणेकरीता दोन स्वतंत्र कप्पे असून त्या सर्व वाहनांवर जीपीएस टॅकिंग यंत्रणा बसविणेत आलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक घंटागाडी कोठे, किती वेळ गेली, थांबली यांचे सर्व माहिती मनपाकडील घनकचरा व्यवस्थापन विभागामध्ये दररोज मिळत आहे. सदर एकूण १२० घंटागाडी खरेदी करीता सुमारे २.५ कोटी इतका खर्च आलेला आहे. सदरचे काम आजमितीस पूर्ण झालेले आहे.




Waste Transfer Station



Compacting Machine Shed



Garbage Compactor

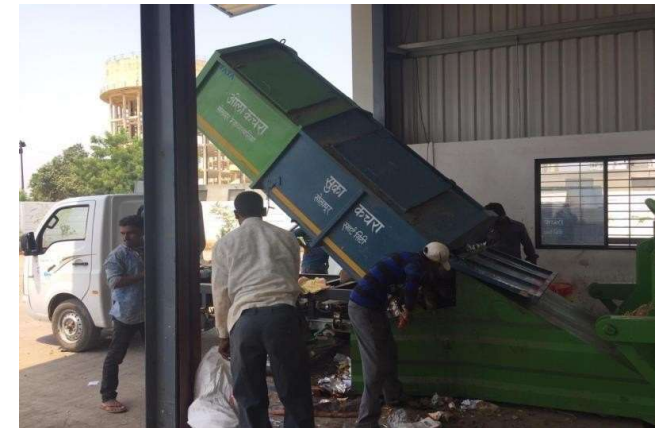

Compacting waste from waste collection vehicle



Operator console



Tip Cart



Hook Loader with 25 GVW vehicle

Smart Road Phase 1 – Redevelopment of Ranga Bhavan Chowk



Work order date : 14th Nov 2017
Completion period : 6 months
Contract Value : Rs. 4.38 Crs
Contractor name : M/s Rajshree Construction Consortium
Completion date : 16th Dec 2018.

रंगभवन चौक येथे पब्लिक प्लाझाची निर्मिती - रंगभवन चौक येथे सौरउर्जेवर आधारित एलईडी पॅनलच्या माध्यमातून आकर्षक अशा पब्लिक प्लाझाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. रूपांतरित रंगभवन चौक हा सोलापूर शहरातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण असा परिसर निर्माण झालेला आहे. मध्यभागी असलेल्या जागेवर अर्ध-छायांकित अर्बन प्लाझा उभारणेत आलेला आहे. ह्यासाठी १०० सोलर पॅनेल्स आणि ३६ एल.ई.डी. व्हिडिओ पॅनेल्सचा वापर केला गेला आहे. ह्यापैकी काही व्हिडिओ पॅनेल्सचा वापर नागरिकांना विविध विषयांवरची माहिती देण्यासाठी केला जात आहे. चौकाभोवती योग्य प्रकारचे पार्किंग आणि क्रॉसिंगची सुविधा उपलब्ध केली आहे. यावर जाहिरात करून मनपाचे उत्पन्न वाढविता येवू शकणार आहे. सदर कामाचा मक्ता राजश्री कन्स्ट्रक्शन, मुंबई यांना देण्यात आला व या कामाकरीता सुमारे ४.३८ कोटी इतका खर्च आलेला आहे. सदरचे काम आजमितीस पूर्ण झालेले आहे. नागरिकांकरीता खुले करणेत आले आहे.



Green space Upliftment- Hutatma Garden

A. Hutatma Garden Phase 2

Work order date	: 25 May 2018
Completion period	: 11 months
Contract Value	: Rs. 1.43 Crs
Contractor name	: M/S Atul Gaikwad
Completion date	: 24 th April 2019

हुतात्मा बाग- शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या या बागेत लाल मातीचा वॉकिंग ट्रॅक, अस्तित्वातील फरशीचे ट्रॅकचे दुरुस्ती, संरक्षक भितींची दुरुस्ती, लाईट व्यवस्था, प्रवेशद्वार, विविध झाडे लावणे, नागबावडी विहरीतील गाळ काढून त्याचे पाणी बागेत पुरविणे, कारंजे तयार करणे इ. विविध सुधारणेची कामे पूर्ण झाली आहेत. सदरचे काम मक्तेदार अतुल गायकवाड यांचे मार्फत करणेत आले असून या कामाकरीता सुमारे र.रु.१.६५ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदरचे काम आजमितीस पूर्ण झालेले आहे. नागरिकांकरीता माहे एप्रिल २०१९ पासून खुली करणेत आले आहे.




Green space Upliftment - Hoam Maidan

B. Hoam Maidan development

Work order date : 20 June 2018
Completion period : 4 months
Contract Value : Rs. 2.42 Crs.
Contractor name : M/S Nikhil Construction
Completion date : 20th Dec 2018

The components included in project :

- Natural red soil walking track
- Fencing
- 12 Gate openings
- Provision of sufficient lights
- Landscaping and planting trees for shadow
- Parking space
- Provision of surveillance and other security provisions etc.

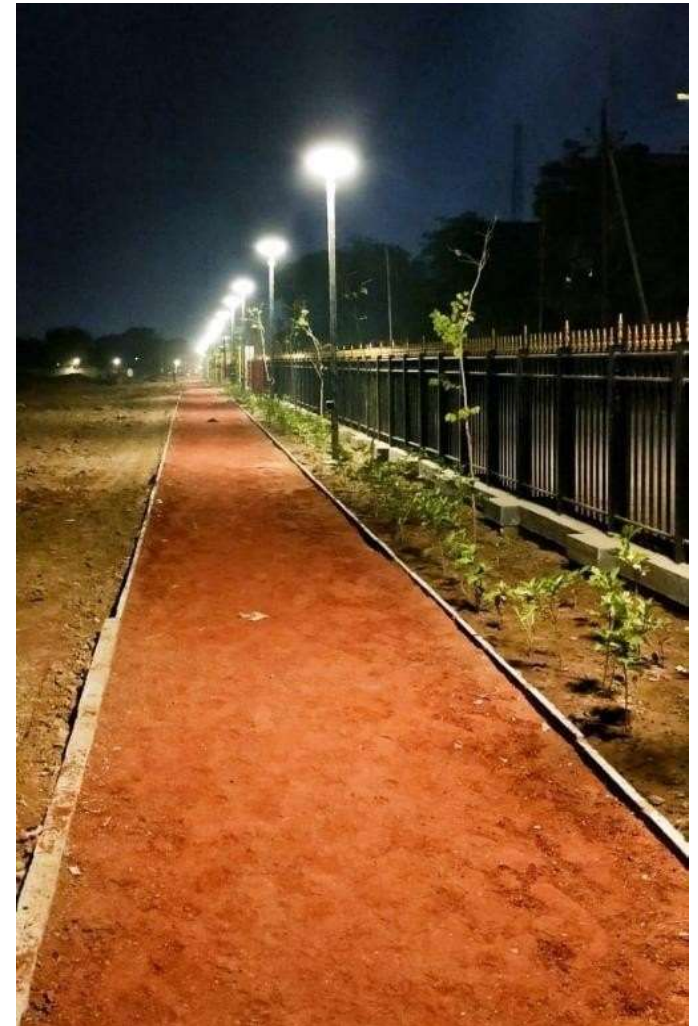

Green space Upliftment- Department Garden


C. Department Garden development near Rippon Hall

Work order date : 20 June 2018
Completion period : 6 months
Contract Value : Rs. 4.31 Crs
Contractor name : M/S Nikhil Construction
Completion date : 12th May 2019

उद्यान विभाग - (पासपोर्ट ऑफीस लगत)- याठिकाणी अँडव्हेचर पार्क करणेत आलेले आहे. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॉडेल, वॉकिंग ट्रॅक, दिव्याची व्यवस्था, प्रवेशद्वार, रेस्टॉरंट, नर्सरी लहान मुलांकरीता खेळण्याची साधने, ई-टॉयलेट इ. कामे करणेत आलेली आहेत. सदरचे काम पुणे येथील निखील कन्स्ट्रक्शन यांना देणेत आले असून,सदर कामाकरीता र.रु.४.३४ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदरचे काम आजमितीस पूर्ण झालेले आहे.




Green space Upliftment- Department

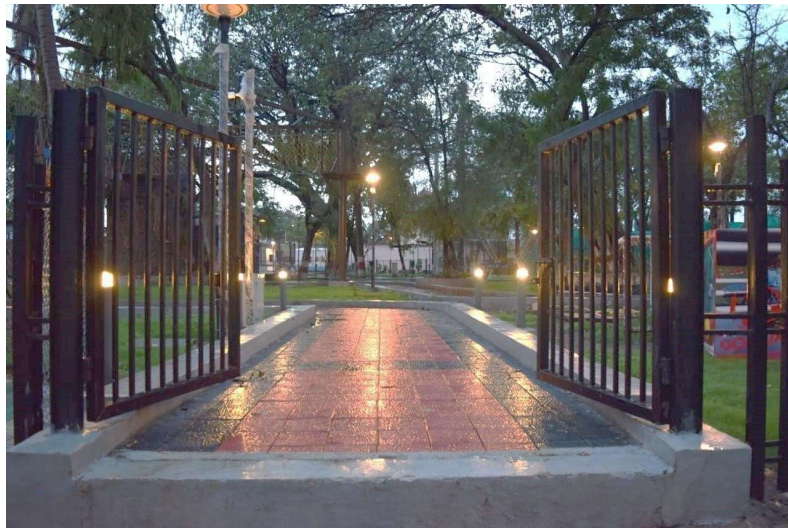

Improvement to Water Distribution System & Sewerage System

Work order date	: 2 nd January 2019
Completion period	: 24 months
Contractor name	: M/S. LC Infra Projects Pvt. Ltd
Work order Cost	: 190.00 Cr

एबीडी एरिया मध्ये पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे -
एबीडी एरियातील पाणीपुरवठा सुरळीत करणे व ड्रेनेज लाईनसाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणेसाठी सुमारे २२६ कोटी इतक्या रक्कमेच्या तरतुदीस १३ व्या बोर्ड बैठकीत मंजूरी देणेत आलेली आहे. सदर कामांचे टेंडर प्रसिध्द करणेत आले असून सदर कामाकरीता यशस्वी मक्तेदार म्हणुन अहमदाबाद येथील एलसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. यांना सदर कामाकरीता दि. ०२ जानेवारी २०१९ रोजी वर्क ऑर्डर देणेत आलेली आहे. सदर कामाकरीता सुमारे १९० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर कामांतर्गत ९३ किमी इतकी ड्रेनेजलाईन व ९१ किमी इतक्या लांबीची पाणीपुरवठा लाईन टाकणेत येणार आहे. तसेच ९३ किमी इतक्या लांबीचे रस्ते झालेले आहे. सदरचे काम शहरातील २२ डीएमए (विभाग) मध्ये विभागले आहे. सदरचे काम आजमितीस पुर्ण झालेले आहे.

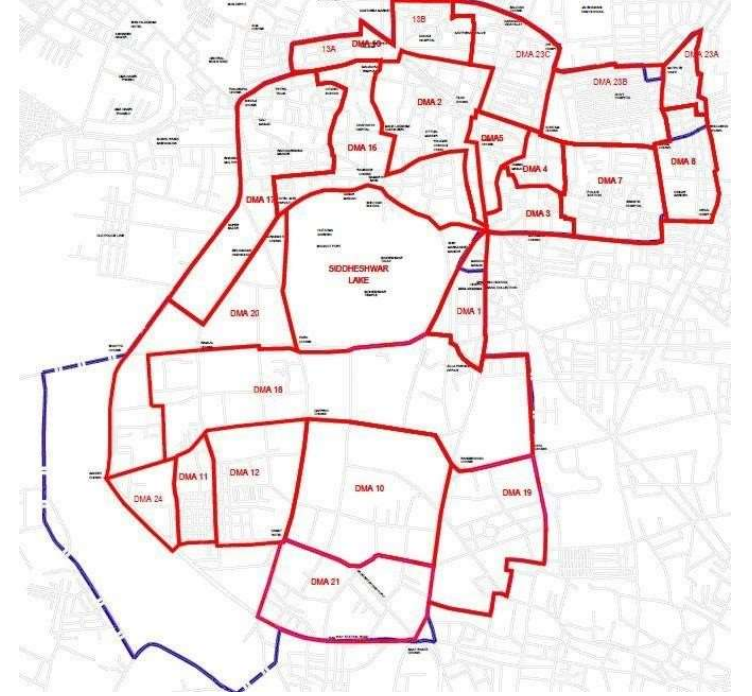

Improvement to Water Distribution System & Sewerage System



Improvement to Water Distribution System & Sewerage System



Smart City
LAUNCHING THE NEW ERA OF URBAN DEVELOPMENT



LED Street Light Infrastructure by SCDCL



Indira Gandhi Stadium Rejuvenation

Work order date : 26th Dec 2019

Completion period : 9 months

Contractor name : M/S. Krishnae Infrastructure Pvt Ltd

Work order Cost : 7.10 Cr

Sr no	Details of Activities	Progress
1	Pavilion building dismantling	100% complete
2	30 yard circle soling work	100% complete
3	30 yard to 60 yard circle soling and aggregate work	100% complete
4	Beyond 60 yard circle soling and aggregate work	100% complete
5	Main pitch all layers except grass layer	100% complete
6	Soling on practice pitches	100% complete
7	Grass laying on practice pitches	100% complete
8	Astro practice pitches	100% complete
9	Soil layer within 30 yard circle	100% complete
10	Grass laying in 30 yard circle	100% complete
11	Soil layer within 60 yard circle	100% complete
12	Soil layer beyond 60 yard circle	100% complete
13	Storm water drainage on periphery of ground	100% complete
14	Brickwork in building	100% complete
15	Flooring work in building	100% complete
16	Electrical work in building	95% complete
17	Painting work in building	100% complete
18	Waterproofing in terrace and toilets	100% complete
19	Walking track beyond ground boundary	100% complete



Indira Gandhi Stadium Development PH-1



इंदिरा गांधी स्टेडियम नूतनीकरण करणे फेज -१ - शहरातील स्थानिक खेळाडुना संधी देणेचे दृष्टीकोनातून इंदिरा गांधी स्टेडियम सर्व खेळांसाठी विकसित करणेचे नियोजन प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये क्रिकेट, खो-खो, बॅडमिंटन, कबड्डी तसेच स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र व्यायामशाळा करणेत येणार आहेत. या कामाकरीता सुमारे २८ कोटी इतक्या निधीची तरतुद करणेत आलेली आहे. पुरातत्व विकास विभाग यांचेकडे नाहरकत मिळणेस्तव प्रस्ताव सादर करणेत आला असून त्यास दिल्ली येथील कार्यालयाकडून दि. १३ डिसें २०१८ रोजी कांही अटींवर नाहरकत प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील कामांकरीता २.५.६५ कोटी इतक्या रक्कमेची निविदा प्रसिध्द करणेत आलेली असून सर्वात कमीचे दर (७.२०% कमी) देणारे मक्तेदार मे.कृष्णाई कन्सट्रक्शन कंपनी, पुणे यांना दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी वर्क ऑर्डर देणेत आलेली आहे. सदरचे काम आजमितीस पूर्ण झालेले आहे. सदर कामांतर्गत क्रिकेट मधील मधोमध असणारे ११ पिचेस काम बनिविणेत आलेली असून सदर पिचेसवर गवत लावणेचे काम पूर्ण झालेले आहे. तर मैदानाच्या दक्षिणेस खेळाडुच्या सरावाकरीता ०७ पिचेसचेही काम पूर्ण झालेले आहे. सदर मैदानाचे आउटफील्डचे काम पूर्ण झालेले असून संपुर्ण मैदानावर गवत लावलेले आहे. तसेच पव्हेलिअन बिल्डींगमधील काम पूर्ण झालेले आहे.




Priority Roads Phase 1 (10.8 km)



Smart City

Work order date : 26th Feb 2019
Completion period : 18 months
Contractor name : M/S. Vijay Infra
Work order Cost : 99.84 Cr

प्राधान्य रस्ते(१०.८ किमी)- शहरातील सिध्देश्वर मंदिराकडे येणारे रस्ते, भुईकोट किल्ल्यालगतचे रस्ते, काठीमार्ग, मिरवणुक मार्ग इ. रस्त्यांचे महत्व विचारात घेवुन त्याठिकाणी रस्त्याचे रिडिझाईन करणे अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे १०.८ कि.मी चे एकुण १२ रस्ते विकसित करणेत येणार आहेत. कांही ठिकाणी सिमेंट कॉक्रीट व कांही ठिकाणी डांबरी रस्ते करणेत आलेले आहेत. या ठिकाणी प्रथमता पाण्याची पाईपलाईन व ड्रेनेज लाईन, पावसाळी गटर इत्यादीचे कामे पुर्ण झालेले आहेत. तसेच रस्ते विकसित करणेचे काम ही अंतिम टप्प्यात आलेले असुन एप्रिल २०२२ अखेरपर्यंत काम पुर्ण करणेचे नियोजन करणेत आलेले आहे. या कामाकरीता सुमारे १०० कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदरचे काम आजमितीस पुर्ण झालेले आहे.

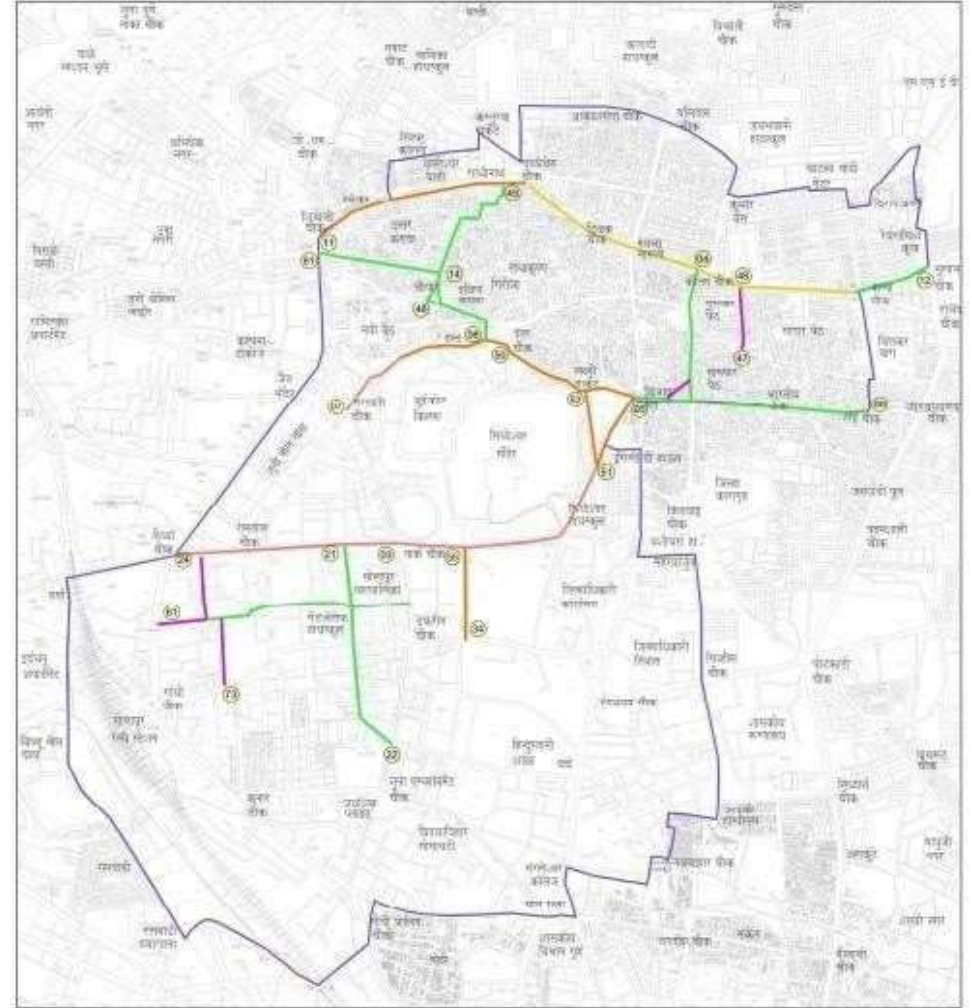

Priority Roads Phase 1 (10.8 km)



Lakshmi Market Rejuvenation

Work order date	: 16 th August 2019
Completion period	: 9 months
Contractor name	: M/S. Rajashree Construction Consortium
Work order Cost	: 8.23 Cr
Current Status	: Completed

लक्ष्मी मार्केट नुतनीकरण करणे – पुरातन वास्तु संवर्धन संकल्पनेवर शहरातील सुमारे १०० वर्षांपुर्वीचे लक्ष्मी मार्केट नुतनीकरण करणेच डिझाईन तयार करणेत आलेले आहे. या करीता सुमारे ८.५० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदरचे काम प्रगतीपथआवर असुन आजमितीस सदर कामाअंतर्गत अस्तित्वातील व्हिक्टोरिया या इमारतीचे पुर्ण करणेत आलेले आहे. सदर मार्केटमध्ये विक्रेत्याकरीता १००० ओटे बांधणेचे काम पुर्ण झालेले असुन त्याठिकाणी किराणा माल, मसाले व इतर वस्तुची विक्री करणेकरीता दुकानदारांसाठी १०० दुकाने बांधणेत आलेली आहेत. सदरचे काम आजमितीस पुर्ण झालेले आहे.




Lakshmi Market Rejuvenation



LED Street Light Infrastructure

एलईडी पथदिव्याकरीता नवीन पोल बसविणे (फेज-२) - शहरातील सुमारे ४० हजार अस्तित्वातील पथदिवे हे एलईडी मध्ये रुपांतरीत करणेत येणार आहेत. या कामाकरीता सोलापूर महानगरपालिकेने EESL या कंपनीसमवेत दि.१० डिसें २०१८ रोजी करारपत्र करणेत आले असुन कंपनीने आजतागायत ४८,००० दिवे बसविणेत आलेले आहे. सदर कामाकरीता सुमारे ५३.६० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.तसेच सात वर्षापर्यंत देखभाल दुरुस्ती संबंधित मक्तेदारांकडुन होणार आहे. तसेच हद्दवाढ भागात ज्याठिकाणी दिवे उपलब्ध नाहीत त्याठिकाणी स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५ हजार विद्युत खांब बसविणेत आलेले आहे. शहराची वाढते क्षेत्रफळ विचारात घेवुन मा.लोकप्रतिनिधीनी वेळोवेळी आवश्यक त्या ठिकाणी शहरात व हद्दवाढ भागामध्ये नवीन पोल उभे करणेची मागणी केलेली होती त्यानुसार संचालक मंडळाने प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने २३७३ इतक्या नवीन विद्युत खांब उभारणेच्या काम हाती घेणेत आलेले असुन आजमितीस १३५० इतके पोल बसविणेत आलेले असुन सदरचे काम आजमितीस पुर्ण झालेले आहे.

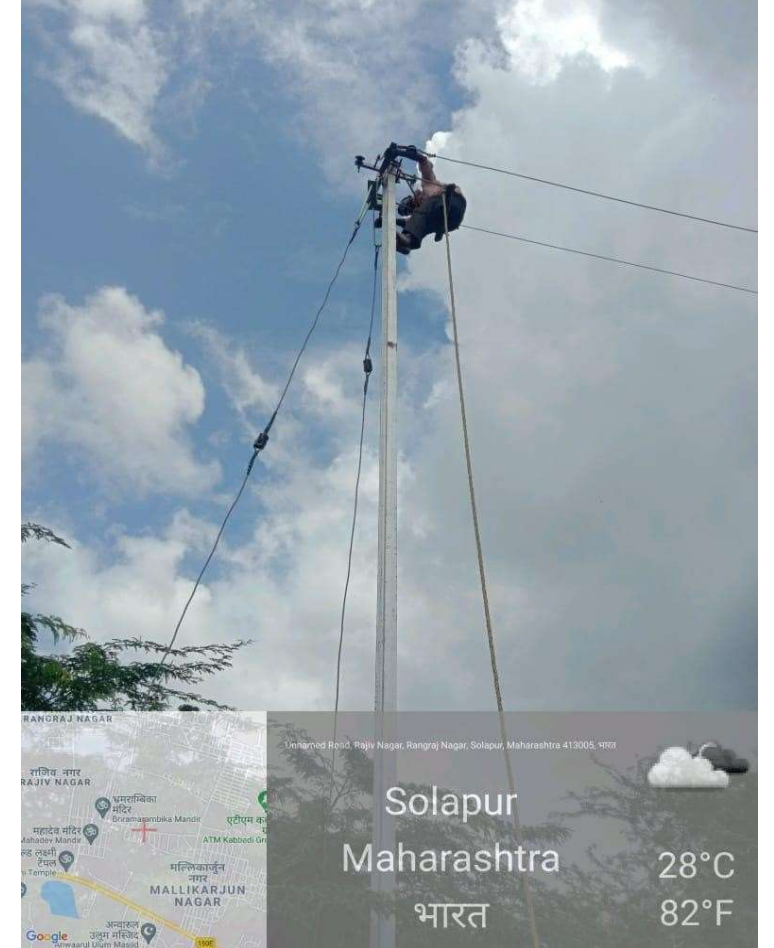

Indira Gandhi Stadium PH-II



Indira Gandhi Stadium PH-II



Light & Sound Show

- सिध्देश्वर मंदिर परिसर सुशोभिकरण करण्यात आले आहे. मंदिर तलाव परिसरमध्ये सोलापुर शहरातील नागरीक व पर्यटकांसाठी "लाईट अँड साउंड शो" हा प्रकल्प विकसित करण्यात आले आहे. सदर प्रकल्प आजमितीस पूर्ण झाले आहे.

- **प्रकल्पाचे स्वरूप:-**

या प्रकल्पाच्या कार्याची व्याप्ती मल्टीमीडीया आधारित "म्युझिकल फाउंटन ऑन वॉटर स्क्रीन लेसर बीम आणि शो" बसविण्यात आले आहे. शो मध्ये 15 मि. ऑडिओ आणि व्हिडिओ ट्रॅक केला आहे. शोचा एकूण कालावधी 30 मि. आहे. सदर चाशोहा मराठी, कन्नड तेलंगु असा एकूण तीन भाषा मध्ये आहे.



Light & Sound Show



Light & Sound Show



Light & Sound Show



Light & Sound Show



